


## Presyn top-floor Heizprotokoll

### Funktions- und Belegeheizen (Vorlauftemperaturen)

- 1.-7. Tag maximal + 20°C
- 8. Tag maximal + 25°C
- 9. Tag maximal + 30°C
- 10. Tag maximal + 35°C
- 11. Tag maximal + 40 °C
- 12. Tag maximal + 45 °C
- 13. Tag maximal + 50 °C
- X: *Trockenheizen bis Belegereife nach Norm erreicht ist, danach Reduktion der Vorlauftemperatur um 10°C /Tag.*

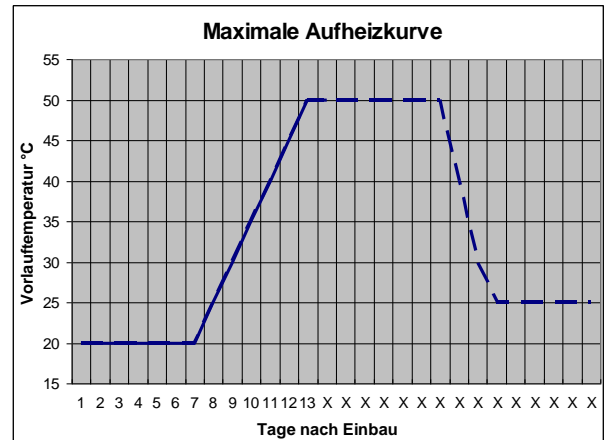

**Geräte zur Luftentfeuchtung dürfen erst 7 Tage nach Einbau in Betrieb genommen!**  
**Die Luftfeuchtigkeit darf während der ersten 14 Tage nach Einbau nicht unter 50% fallen!**

**Objekt:** \_\_\_\_\_

**Heizungssystem:** \_\_\_\_\_

**Einbaudatum:**

Beginn:

Ende: \_\_\_\_\_

**Durchschnittliche  
Einbaustärke:** \_\_\_\_\_

mm

**Aufheizbeginn:**

Datum:

Vorlauftemperatur (Soll: max. + 20°C)

**1. Steigerung:**

Datum:

Vorlauftemperatur (Soll: max. + 25°C)

**2. Steigerung**

Datum:

Vorlauftemperatur (Soll: max. + 30°C)

**3. Steigerung**

Datum:

Vorlauftemperatur (Soll: max. + 35°C)

**4. Steigerung**

Datum:

Vorlauftemperatur (Soll: max. + 40°C)

**5. Steigerung**

Datum:

Vorlauftemperatur (Soll: max. + 45°C)

**6. Steigerung**

Datum:

Vorlauftemperatur (Soll: max. + 50°C)

**Heizreduktion:**

Datum:

Senkung der Vorlauftemperatur um 10° C / Tag bis eine Vorlauftemperatur von 25°C erreicht ist.

Beginn

Datum:

Ende \_\_\_\_\_

**Auftraggeber:**

**Heizungsfirma:**

Datum:

Datum: \_\_\_\_\_

Unterschrift:

Unterschrift: \_\_\_\_\_

Weitere Produkteinformationen:

-Information Nachbehandlung I-400-006

-[www.presyn.ch](http://www.presyn.ch)

Die vorstehenden Angaben stützen sich auf den heutigen Stand der Technik. Für unsachgemässe Verarbeitung und Anwendung wird nicht gehaftet.
